

특 수 공 시

- 13개 사업 -

특수공시 사업

①	시립도서관 건립	시립도서관관리과/29p
②	추모관 증축사업	복지지원과/33p
③	금강체육공원 조성	문화체육과/37p
④	시립박물관 건립	문화체육과/41p
⑤	예술회관 건립	문화체육과/45p
⑥	진포해양테마공원 조성	관광진흥과/49p
⑦	금강호관광지 조성	관광진흥과/53p
⑧	은파 자전거도로 개설	관광진흥과/59p
⑨	주민숙원사업 추진	건설과/63p
⑩	도시주거환경개선사업	건축과/67p
⑪	재해위험지구 정비사업	재난관리과/71p
⑫	노후수도관 교체공사	수도과/77p
⑬	농업테마체험공원 조성	농촌지원과/81p

특수공시의 항목선정과 작성기준

□ 분야별 항목선정

- 지역특성을 고려한 주민관심사항을 재정공시심의위원회에서 심의·선정 ⇒ 2~3배수 선정, 5건 이상 재정공시
- '08년 재정운영 결과에 한정하며 미래의 계획 등은 제외 (재정운영 결과로서 미래를 예측할 수 있게 함)
 - 핵심 지역숙원사업 또는 특수 유치사업의 국비·지방비 등 재원 확보 및 집행상태와 추진실적
 - ▶ 노인치매병원 유치, 실버타운 건설, 기업도시 건설 등
 - 재해위험지역 재정지원 결과 전년대비 피해축소 등 안전관련 주민관심사항
 - ▶ 재해위험지역, 교통사고 다발지역, 재해관련 상습피해 지역 등
 - 지역 전략산업의 재원확보 및 분양실적
 - ▶ BIO산업단지, 의료도시 활성화 등
 - 지역 특수 주거여건인 달동네 주택개량 사업에 대한 재정 중점 지원 등 주민관심사항
 - 지역 주차난 해소를 위한 공영주차장 설치·투자 등 기타 당면 지역현안사항 추진실적

□ 작성요령

- 특수공시 내용을 사업목적, 기간, 사업규모, 추진상황, 사업 효과 등을 알기 쉽게 개조식으로 작성, 향후 계획은 제외
- 도표, 그래프, 사진 등을 활용, 주민의 이해도 제고

군산시립도서관건립사업

담당부서명	전화번호
시립도서관관리과	450-6577

<목 적>

- 시민 정보 이용 및 문화 활동 욕구에 부응하는 교육 문화 기반 시설 확충
- 우수 인재 육성을 위한 지식 인프라 구축으로 정주 생활 환경 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2004 ~ 2008
- 위 치 : 군산시 수송동 798-1
- 사업규모 : 부지 2,450㎡, 연면적 5,508㎡(지상6층, 지하1층)
- 총사업비 : 10,100백만원(국비3,000 도비1,500, 도교육청1,000 시비4,600)
- '08사업비 : 3,994백만원(국비1,390 , 도비2,000 , 시비 604)
- 주요 시설
 - 일반자료실, 유아동자료실, 디지털자료실, 문화교실, 교양문화실, 휴게실, 대회의실(새만금드림홀), 세미나실 등

□ 사업진행현황

- 건립 타당성 조사 용역 완료 - 2003. 10. 1
- 투융자 심사 완료 (전북도) - 2004. 5. 6
- 실시 설계 완료 - 2006. 4. 24
- 시립도서관 준공 - 2008. 12. 28
- 운영기반조성사업 - 2009. 1 ~ 6
- 시립도서관 개관 - 2009. 6. 9


□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

(단위 : 백만원)

년도	총 사 업 비					기타
	계	국비	도비	시비	기타	
2005	680	200		480		
2006	1,200	200	500	500		
2007	3,730	710		3,020		
2008	3,994	1,390	2,000	604		

○ 그래프 작성

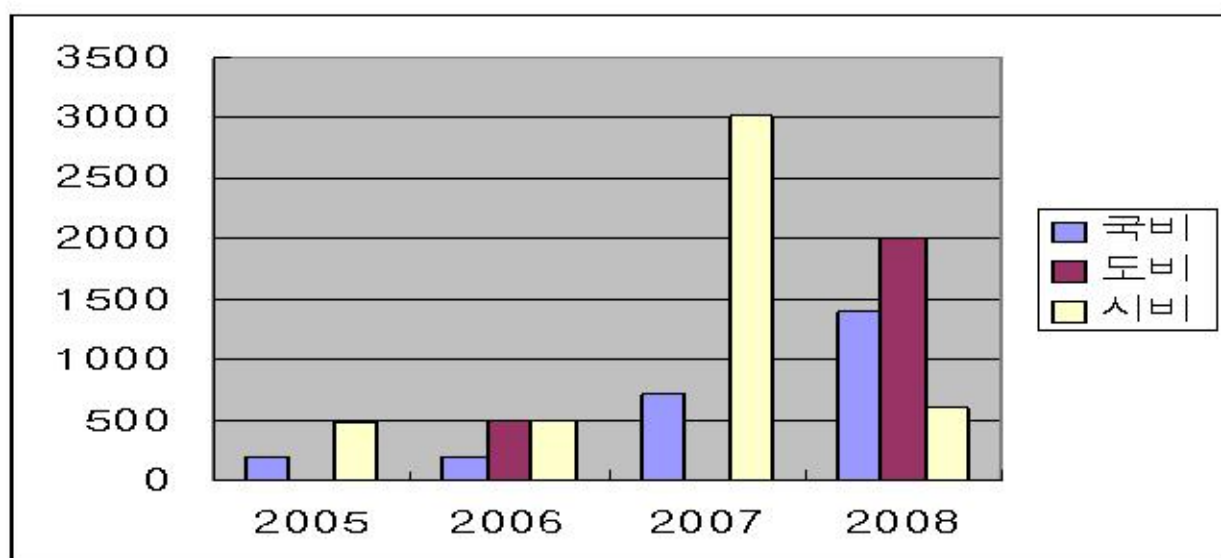

□ 기대효과

- 정보화 시대에 맞는 정보 인프라 구축으로 시민의 지식 정보 격차 해소
- 교육 문화 시설 확충으로 문화 불균형 해소 및 시민의 삶의 질 향상
- 정주 생활 여건 조성으로 지역 장기 발전의 토대 마련

□ 도면 및 사진

○ 위치 도면



○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



○ 현장 사진(공사후)



추모관(봉안당) 증축사업

담당부서명	전화번호
복지지원과	450-6160

<목 적>

- 매장위주의 장묘관행에서 화장·봉안문화의 정착으로 봉안당 이용수요가 증가하여 현재의 봉안당 만장예상(2009년도)
- 시민의 안정적인 봉안수요 충족으로 선진장사문화 정착

□ 사업개요

- 기 간 : 2008. 3. ~ 2009. 10.
- 위 치 : 군산시 임피면 보석리 452-23번지
- 사업규모 : 1,300㎡(지하1층,지상3층), 안치구수-10,000기
- 총사업비 : 2,000백만원(국비 1,050, 도비 150, 시비 800)
- '08사업비 : 2,000백만원(국비 1,050, 도비 150, 시비 800)
- 사업내용
 - 지하 1층 : 주차장, 휴게실
 - 지상 1층 : 사무실 및 봉안당, 지상 2·3층 : 봉안당

□ 사업진행현황

- 추모관(봉안당) 증축 부지 선정 : 2006. 2월
- 전라북도 투·융자 심의 : 2006. 4월
- 국고보조사업 예산신청 : 2007. 4월
- 추모관(봉안당) 국고보조금 확정 내시 : 2008. 3월
- 실시설계 및 도시계획시설결정 용역 발주 : 2008. 3월
- 공유재산 취득심의 및 공유재산 관리계획 의회 승인 : 2008. 8월
- 추모관(봉안당) 공사 발주 : 2008. 11월

□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

(단위 : 백만원)

년도	총 사 업 비(백만원)					기타
	계	국비	도비	시비	기타	
2005						
2006						
2007						
2008	2,000	1,050	150	800		

□ 기대효과

- 묘지로 인한 국토의 무분별한 잠식 예방과 효율적인 활용
- 안정적인 봉안수요 충족으로 선진장사문화 조기 정착

□ 도면 및 사진

○ 조감도

군산시 추모관(납골당) 건축공사



○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



금강체육공원 조성사업

담당부서명	전화번호
문화체육과	450-4281

<목 적>

- 시민의 건강증진과 여가선용을 위해서 생활체육 활동 공간은 물론 휴식·레저·관광을 즐길 수 있는 장소를 제공하고
- 전국규모 체육대회 유치 및 개최로 지역경제 활성화를 도모하며 시민의 자긍심을 고취 할 목적임

□ 사업개요

- 기 간 : 2006년 ~ 2008년
- 위 치 : 군산시 내흥동 894번지 일원
- 사업규모 : 축구전용구장 1면
- 총사업비 : 1,368백만원(국비 500, 시비 868)
- 사업내용
 - 축구전용구장 조성 1식 (인조잔디필드, 라인규격 105m×68m)
 - 부대시설 (본부석, 라커룸, 화장실 등)

□ 사업진행현황

- 2006. 12. 27 : 기본계획 및 기본·실시설계 용역
- 2007. 11. 23 : 인조잔디 축구전용구장 조성공사 착공
- 2008. 5. 21 : 축구장 조성공사 완료
- 2008. 6. 5 : 축구장 전기공사 완료


□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

(단위 : 백만원)

년도	총 사 업 비					기타
	계	국비	도비	시비	기타	
2006	102			102		
2007	182	91		91		
2008	1,084	409		675		

○ 그래프 작성

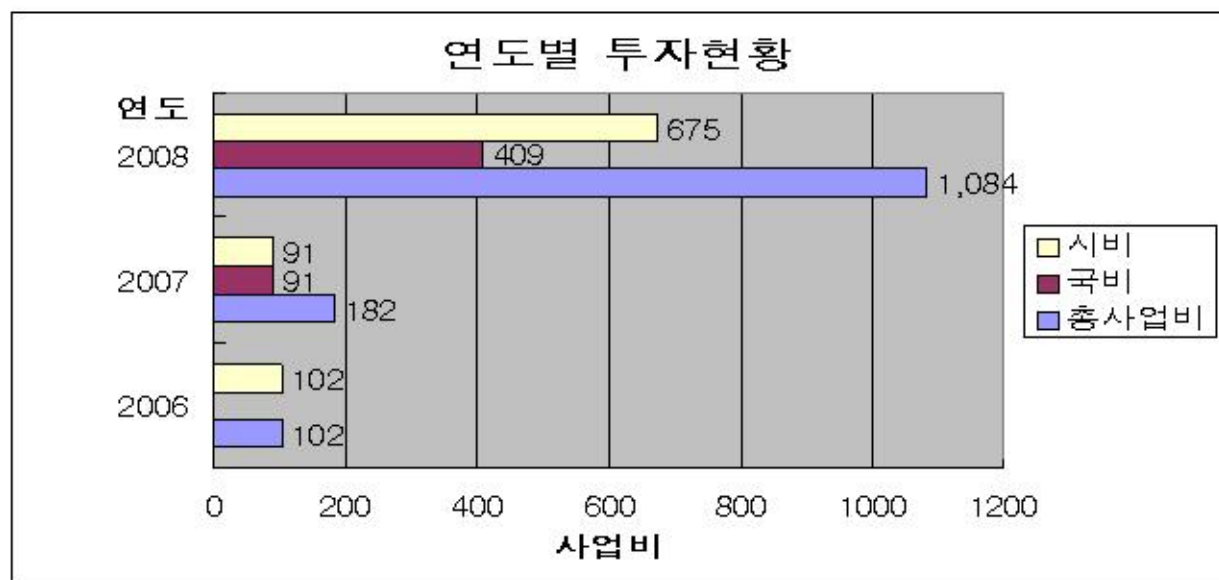

□ 기대효과

- 군산시 북부권 공원지역내 축구전용구장 조성 완료로 하구둑 인근은 물론 군산시 축구동호인들의 이용활성화 기대
- 전국축구대회 유치 및 개최에 필요한 기반시설이 완비되어 지역경제 활성화 기대
- 주변의 시민 편익시설과 연계 휴식·레저활동을 겸비함으로써 시민 건강증진과 건전한 여가선용 기대

□ 도면 및 사진

○ 위치도면



○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



○ 현장 사진(공사후)



군산시립박물관 건립사업

담당부서명	전화번호
문화체육과	4305, 4385

<목 적>

- 시립박물관 건립으로 역사성 제고
- 군산에서 발굴되는 유물을 전시할 수 있는 공간 창출을 통해 군산의 유물이라는 자긍심 도출

□ 사업개요

- 기 간 : 2006 ~ 2011
- 위 치 : 군산시 장미동 1-67 외 30필지
- 사업규모 : 대지면적 : 8,346.70㎡, 연면적 : 4,248.01㎡,
지하1층, 지상4층
- 총사업비 : 18,200백만원(국비:37.5억원, 시비:144.5억원)
- '08사업비 : 9,600백만원(시비:96억원)
- 사업내용
 - 군산시립박물관은 군산 내항 재개발 기본계획에 따른 문화 전시시설로서 내항개발의 첫 시작.
 - 위치는 구세관과 나가사끼은행 사이로 근대역사문화재와의 어울림을 통하여 근대와 현대를 이어주는 가교의 역할을 함.
 - 총 4층의 건물로서 1층에는 해양물류역사관과 어린이박물관이 있고, 3층에는 근대생활관과 기획전시실이 있으며 나머지 공간은 행정과 서비스의 공간

□ 사업진행현황

- '08. 12. 4 : 군산시립박물관 사업인정고시
- '08. 12. 26 : 설계용역 완료 - 길 건축사사무소
- '09. 3. 20 : 군산시립박물관 건립공사 착공(신성건설)
- '09. 4. 30 : 전면책임감리용역 착수(정림건축)
- '09. 6. 5 : 군산시립박물관 건립 기공식
- ~ 현재 : 파일 기초공사 시공 중


□ 연도별 투자현황

(단위 : 백만원)

년도	총 사 업 비					기타
	계	국비	도비	시비	기타	
2007	34	13	-	21	-	
2008	96	-	-	96	-	
2009	22	-	-	22	-	

- 그래프

연도별 투자 현황

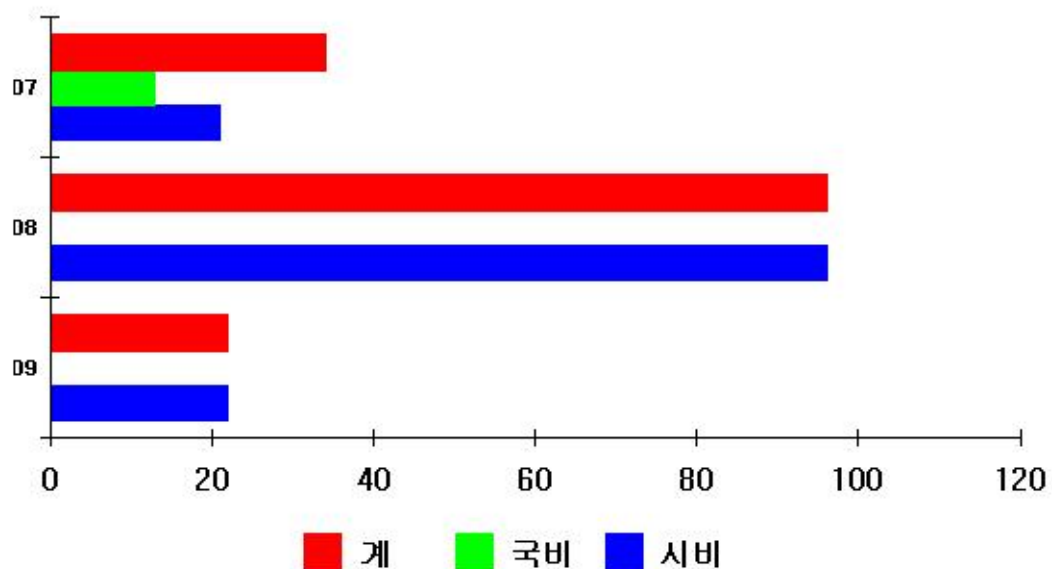

□ 기대효과

- 군산시립박물관(이하 '박물관') 건립은 낙후된 원도심의 활성화에 첫발을 내딛는 시발점이라는 것에서 그 의미가 깊음.
- 군산에서 발굴된 소중한 유물이 다른 지역으로 유출되는 것을 차단하고 우리시에 전시함에 따라 '군산유물'이라는 자긍심 고취.
- 박물관의 각종 프로그램을 통하여 군산역사·유물, 근대문화, 군산의 바다등을 쉽게 접할 수 있어 군산에 대한 정체성 확립.
- 문화적인 측면에서 가족과 함께 손잡고 방문함에 따라 가정적인 문화 확립에 기여.

□ 도면 및 사진

- 위치도면



○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



예술회관 건립사업

담당부서명	전화번호
문화체육과	450 - 4305

<목 적>

- 현대화된 문화시설 부재와 노후로 시민수요 충족미달
- 국가공단과 연계한 컨벤션센터 등 국제적 시설 확보
- 세계 최장 새만금방조제 완공 후 국제적 문화 경쟁력 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2007 ~ 2012
- 위 치 : 군산시 지곡동 286-9번지외 50필지(새들공원내)
- 사업규모 : 44,000㎡
- 총사업비 : 76,000백만원(국 20억, 특교 30억, 도 30억, 시 680억)
- '08사업비 : 18,200백만원(국 20억, 시 162억)
- 사업내용
 - 연면적 : 18,503.37㎡
 - 규 모 : 지하 1층, 지상 3층
 - 대공연장(1,200석), 소공연장(450석), 전시장, 시립예술단 연습실등

□ 사업진행현황

- 2008. 1. : 중앙재정투융자 심사
- 2009. 2. : 교통영향평가 및 사전영향평가 심사
- 2009. 4. : 군산예술회관 설계용역 완료
- 2009. 7. : 군산예술회관 신축공사 착공 - 대우건설(주)
- 2009. 7. : 군산예술회관 기공식


□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

(단위 : 백만원)

년도	총 사 업 비					기타
	계	국비	도비	시비	기타(특교)	
합계	76,000	2,000	3,000	68,000	3,000	
2007	3,600	0	0	600	3,000	
2008	18,200	2,000	0	16,200	0	
2009	5,500	0	1,000	4,500	0	
2010이후	48,700	0	2,000	46,700	0	

○ 그래프

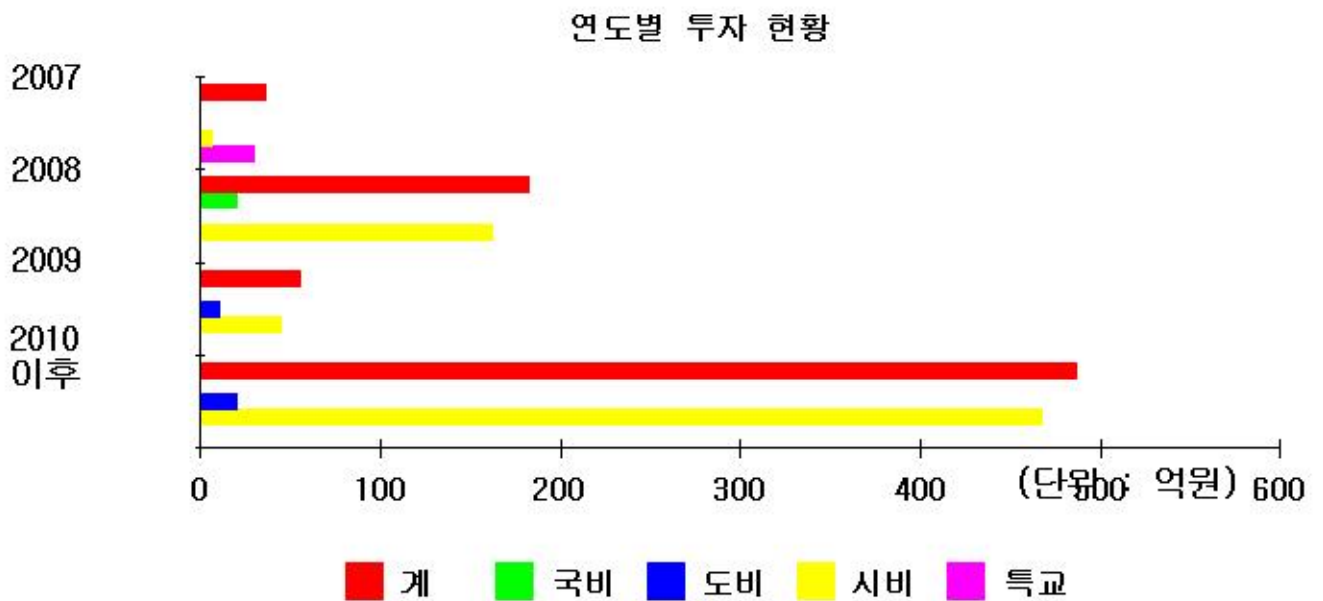

□ 기대효과

- 문화기반시설 확충으로 삶의 질 향상
- 새만금 방조제 완공과 연계한 해양관광 기여
- 평생교육 및 체험학습의 장 제공으로 교육의욕 고취

□ 도면 및 사진

○ 위치도면



○ 현장 사진(공사전)



○ 조감도



진포해양테마공원 조성

담당부서명	전화번호
관광진흥과	6325

<목 적>

- 고려말 최무선장군이 왜선 500여척을 패퇴시킨 전적지에 진포해양테마공원을 조성하여 시민의 역사의식 고취와 관광자원개발을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요(휴먼명조 18)

- 기 간 : 2007. 10~2010. 12
- 위 치 : 군산시 장미동 내항일원
- 사업규모 : 육,해,공군 퇴역군장비(13종 16대) 전시
 - 육군(6대) : M48(전차2대), M548(탄약운반차2대), 자주포(2대)
 - 해군(3대) : LST(위봉함), LVT(장갑차), 해경함정(273함)
 - 공군(7대) : F-4, F-5, F-86, 수송기(C-123), O-2, UH-1, T-41
- 총사업비 : 4,900백만원(국비 500, 시비 4,400)
- '08사업비 : 1,000백만원(국비 500, 시비 500)
- 사업내용
 - 조경식재 및 편익시설물 설치
 - 퇴역군장비 외부 경관 조명 설치

□ 사업진행현황

- 2007. 3. 30 : 육,해,공군 퇴역군장비 무상대여 확정
- 2007. 8. 13 : 기반시설 실시설계용역 완료

- 2007. 8. 28 : 공유수면 점·사용허가 완료
- 2007. 12. 25 : 해군함정 거처 완료
- 2007. 12. 28 : 해군LVT상륙장갑차(1대), 육군M548(2대) 운반 완료
- 2008.1~8월 : 퇴역군장비 10대 운반배치완료
 - M48전차2대, 8인치자주포2대, 전투기3대(F4,F5,F86), 정찰기(O2), 수송기(C123), 헬기(UH1)
- 2008.4~7월 : 함정내외 안전시설, 도색, 전기, 경관조명 설치
- 2008.5.5~6.1(28일간)임시개원 :방문객 총수 14,049명
(1일 평균 502명)
- 2008. 8. 3 : 해경 경비정(250톤급) 운반 거처 완료

□ 연도별 투자현황


년도	총 사 업 비 (단위 : 백만원)					기타
	계	국비	도비	시비	기타	
2007	1,900			1,900		
2008	1,000	500		500		

□ 기대효과

- 퇴역 군장비를 활용한 관광 자원화추진과 지역경제 활성화 기여

□ 도면 및 사진

○ 위치도면

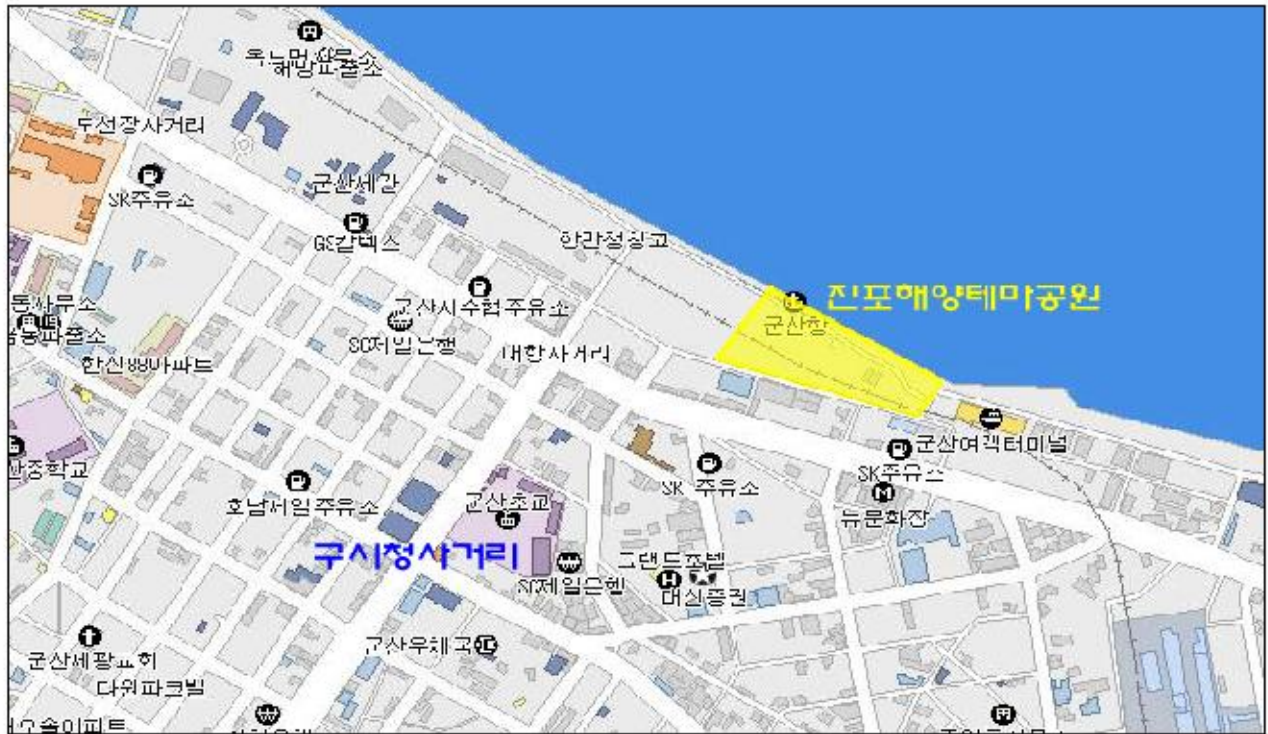

○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사후)



○ 조감도



금강호 관광지 조성사업

담당부서명	전화번호
관광진흥과	450-4436

<목 적>

- 금강호 주변을 생태관광지 종합개발로 금강철새조망대와 연계한 4계절 체류형 국제생태 관광지 조성
- 생태 및 관광 인프라 구축으로 국제적 생태관광 도시 이미지 제고와 관광객 편의 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 1992 ~ 2012
- 위 치 : 군산시 성산면 성덕리 일원
- 사업규모 : 597,868m²
- 총사업비 : 65,130백만원 (국 12,560, 도 708, 시 11,852, 민자 40,010)
- '08사업비 : 2,100백만원 (국 300, 도비 0, 시비 300, 민자 1,500)
- 사업내용 : 공공·편익 숙박, 상가, 운동·오락, 휴양 문화 기타 시설
 - 공공·편익 : 도로(9km), 주차장(6개소), 광장(6개소), 화장실(4개소), 하수처리장
 - 숙 박 : 관광호텔, 여관(2개소)
 - 상 가 : 매점및휴게음식점(6개소), 일반음식점(29개소), 휴게음식점(2개소), 매점(4개소)
 - 운동·오락 : 기계유희시설, 볼링장및사격장
 - 휴양·문화 : 자연학습장, 유스호스텔, 야유회장, 식물원, 조각원
 - 기 타 : 녹지, 유보지

□ 사업진행현황

- 1992년~2007년까지 실적 : 23,022백만원 (공공8,222, 민자14,800)
 - 공공부문 : 도로(3.2km), 주차장(2개소), 화장실(1개소), 생태습지
 - 민자부문 : 관광호텔(리버힐), 매점 및 일반음식점(금강휴게소+음식점단지), 기계유희시설(금강랜드)
- 2008년 실적 : 2,100백만원 (공공 600, 민자 1,500)
 - 공공부문 : 도로(0.5km), 주차장(2개소)
 - 민자부문 : 일반음식점(1개소) 및 기계유희시설(금강랜드)

□ 연도별 투자현황

년도	총 사업비					기타
	계	국비	도비	시비	기타(민자)	
1992 ~ 2004년	9,190	2,145	644	1,501	4,900	
2005	2,180	540	64	476	1,100	
2006	5,952	426		426	5,100	
2007	5,700	1000		1000	3,700	
2008	2,100	300		300	1,500	

□ 기대효과

- 금강철새조망대 와 연계한 국제적 생태관광지 조성으로 생태 및 관광인프라 구축을 통한 관광산업 및 지역경제 활성화
- 관광편의시설 확충으로 질 높은 관광서비스 제공을 통해 관광객 유치

□ 도면 및 사진

○ 위치도면



○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



○ 현장 사진(공사후)



은파 자전거 도로개설

담당부서명	전화번호
관광진흥과	6325

<목 적>

- 수변산책로, 자전거도로 시설로 생동감 넘치는 관광지 조성
- 수변공간을 중심으로한 자연속의 웰빙 심신단련 공간 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2006. 01~2010. 12
- 위 치 : 군산시 은파관광지 일원
- 사업규모
 - 자전거도로 L = 3.7km. B = 2.6, 산책로 L = 8.7km. B = 2.6m
 - 편입토지164필/71,463㎡(국.공유91필/53,457㎡, 사유73필/18,006㎡)
- 총사업비 : 6,562백만원(국비 3609, 시비 2,953)
- '08사업비 : 1,500백만원(국비 900, 시비 600)
- 사업내용
 - 연꽃 관찰데크 L=262m B=3.0m (수라상앞)
 - 1구간 산책로(데크) L=316m B=2.0m (관리사무실~보트하우스)

□ 사업진행현황

[2006년 실적]

- 사업량 : L = 800m. B = 6m (몰빛다리종점 ~음식점부지)
- 사업개요 : 석분포장, 전석쌓기, 수로관매설, 가로등설치
- 사업비 : 800백만원(국비)
- 사업기간 : '06. 6. 10 ~ '06. 9. 30

[실시시설계용역]

- 총괄사업 실시시설계용역 완료 : '07. 2. 20 (103백만원)

[2007년 실적]

- 사업량
 - 연꽃 관찰데크 L=262m B=3.0m (수라상앞)
 - 1구간 산책로(데크) L=316m B=2.0m (관리사무실~보트하우스)
- 사업비 : 1,300백만원
- 사업기간 : '07. 12. 5 ~ '08. 7. 6

[2008년 실적]

- 사업량
 - 연꽃 수생식물 관찰수조 설치(2개소) L=20m, B=2.5m
 - 조경석쌓기 및 점토블록 포장(1구간:관리사무소앞, 연꽃데크종점부)
 - 자전거도로(산책로) 토공작업 추진 L=5.2km
 - 체육시설 6개소, 자전거보관대 5개소
- 사업비 : 1,500백만원
- 사업기간 : '08. 2 ~ '09. 9. 30

□ 연도별 투자현황

- 연도별 투자 현황

년도	총 사업비 (단위 : 백만원)					기타
	계	국비	도비	시비	기타	
2006	1,600	800		800		
2007	1,300	800		500		
2008	1,500	900		600		

□ 기대효과

- 친환경적 레저활동 공간을 조성하여 관광객에게 휴식공간제공

□ 도면 및 사진

○ 조감도



주 민 숙 원 사 업 추 진

담당부서명	전화번호
건설과	450-4487

<목 적>

- 주민불편해소 및 안전사고 사전예방으로 주민생활 편의 제공
- 도시기반시설 확충으로 살기 좋은 군산건설

□ 사업개요

- 기 간 : 2008. 1 ~ 2008. 12
- 위 치 : 27개 읍,면,동
- 사업규모 : 61건
- 총사업비 : 2,940백만원 (시비)
- 사업내용
 - 아스팔트 덧씌우기 : 20건 L= 26,395m 1,395백만원
 - 도로 확장 및 포장 : 19건 L= 5,537m 851백만원
 - 배 수 로 및 기 타 : 22건 L= 4,3224m 694백만원

□ 사업진행현황

- 08. 1 ~ 3 : 조사측량 및 설계
 - 주민숙원사업 조기발주 합동설계반 구성 운영(6조 24명)
- 08. 3 ~ 11 : 사업착공 및 공사추진
- 08. 12 : 사업준공

□ 세부추진현황(읍,면,동별)

(단위 : 건/m/백만원)

구분	건수	사업비	덧 씌 우 기			도로확장 및 포장			배수로 및 기타		
			건수	사업량	사업비	건수	사업량	사업비	건수	사업량	사업비
옥구읍	4	214	1	1,250	65	2	915	132	1	34	17
옥산면	2	87	1	2,400	61	1	131	26			
회현면	11	207				6	1,411	95	5	1,296	112
임피면	1	69							1	478	69
서수면	3	172				3	980	172			
대야면	2	68	1	1,190	54	1	100	14			
개정면	4	159	1	735	56	1	820	63	2	74	40
성산면	2	122	1	3,600	92				1	200	30
나포면	2	112	2	3,740	112						
옥도면	2	174				1	100	76	1	300	98
옥서면	4	191	1	1,300	65	1	300	90	2	160	36
해신동	1	43	1	800	43						
월명동	1	46	1	1,010	46						
삼학동	2	210	2	2,100	210						
신흥동	3	153	1	800	110	1	213	27	1	30	16
중앙동	2	127	2	1,230	127						
홍남동	1	120	1	1,590	120						
조촌동	1	75	1	1,380	75						
경암동	1	53	1	900	53						
구암동	2	85	1	1,500	66				1	97	19
개정동	2	114	1	870	40				1	400	74
수송동	2	41							2	245	41
나운1동	1	40							1	208	40
나운2동	1	40							1	400	40
나운3동	2	93				1	311	76	1	260	17
소룡동	1	45							1	140	45
미성동	1	80				1	256	80			
계	61	2,940	20	26,395	1,395	19	5,537	851	22	4,322	694

□ 기대효과

- 생활기반시설 정비로 쾌적한 주거환경 조성 등 도심미관 개선
- 안전사고 사전예방 등 주민숙원 해소와 삶의질 향상에 기여

□ 현황사진

○ 공사전



○ 공사중



○ 공사후



2단계 도시주거환경개선사업

담당부서명	전화번호
주거환경개선담당	450-4475

<목 적>

- 주거환경이 열악한 도시 저소득 주민 집단 거주지역 정비로 쾌적한 도시환경을 조성하고 주민들의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2006 ~ 2012
- 위 치 : 군산시 일원
- 사업규모 : 9개 지구 (현지개량 3, 공동주택 6)
- 총사업비 : 34,520백만원 (국비 17,260 시비 17,260)
- '08사업비 : 4,000백만원 (국비 2,000 시비 2,000)
- 사업내용
 - 현지개량사업 : 기반시설(도로, 주차장, 공공공지 등) 설치
 - 공동주택사업 : 국민임대 등 공동주택 및 기반시설 설치

□ 사업진행현황

지구명	사업기간	사업비 (백만원)	사업 규모	추진내용	구분
금동지구	'06년~'08년	2,782	2건	공공공지, 주차장	완료
송풍지구	'06년~'08년	1,338	3건	공공공지, 주차장, 어린이놀이터	완료
수송2지구	'08년~'12년	2,000	1건	국민임대 건설예정(주택공사) - 기반시설 대행사업비 지급 완료	추진중

□ 연도별 투자현황


○ 연도별 투자 현황

(단위 : 백만원)

년도	총 사 업 비					기타
	계	국비	도비	시비	기타	
2006	2,712	1,356		1,356		
2007	2,724	1,362		1,362		
2008	4,000	2,000		2,000		

○ 그래프 작성

연도별 투자 현황

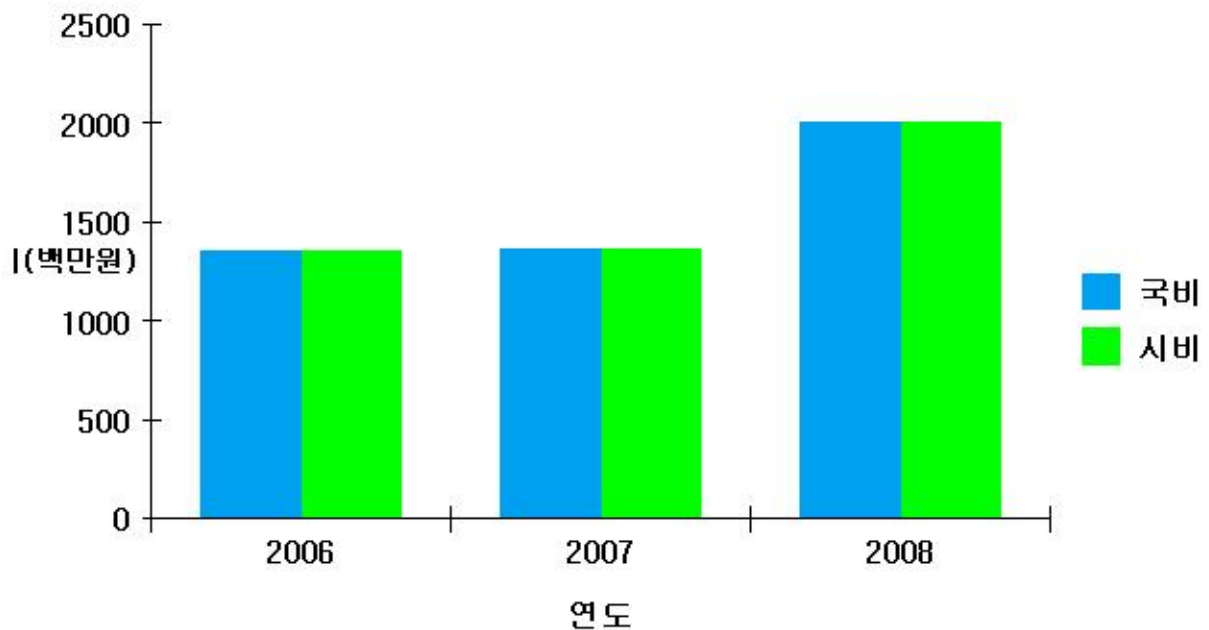

□ 기대효과


- 노후·불량 집단주거지 정비로 도시미관개선
- 기반시설 확충을 통한 주민의 삶의 질 향상
- 국민임대주택 건설로 서민 주거안정에 이바지

□ 도면 및 사진

○ 위치도면



○ 현장 사진(공사전) / 금동지구

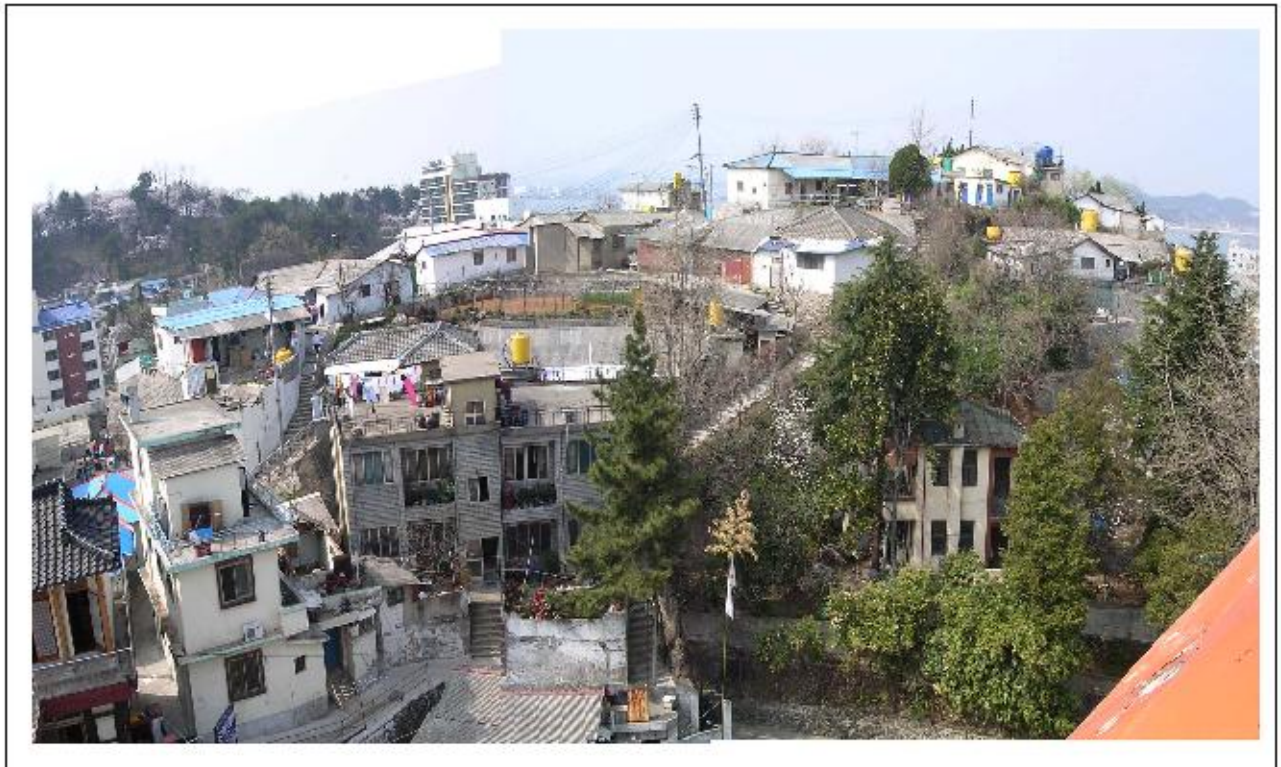

○ 현장 사진(공사중)



○ 현장 사진(공사후)



재해위험지구 정비사업

담당부서명	전화번호
재난관리과	450-4497

<목 적>

- 자연재해 위험지역을 체계적으로 정비 사업효과 극대화
- 재해위험요인 사전제거와 동시에 고지대 주거환경 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 1단계(2005~2011), 2단계 2012년 이후
- 위 치 : 군산시 옥서면 외성산지구등 21개소
- 총사업비 : 79,900 백만원 (국 47,940, 지방비 31,960)
- '08사업비 : 5,200 백만원 (국 3,120, 도 1,040, 시 1,040)
- 사업내용
 - 외성산 : 옹벽 124m, 배수로 402m, 조경 1식
 - 개야도 : 지장물, 토지보상, 보강토 옹벽 및 폐기물 처리 1식
 - 해망9통: 지장물, 토지보상
 - 선양동 : 지장물, 토지보상

□ 사업진행현황

- 외성산 : 옹벽 124m, 배수로 402m, 조경 1식
 - 공사기간 2008. 4.10 ~ 2008. 11.25
- 개야도 : 지장물 10동, 배수로 363m, 옹벽 368m
 - 공사기간 2008. 11. 6 ~ 2009. 11. 6
 - 공정을 90% (2009.7월 현재)
- 해망9통 : 보상 23필지, 지장물 30동
- 선양동 : 보상 10필지, 지장물 23동


□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

(단위 : 백만원)

년도	총 사업비					기타
	계	국비	도비	시비	기타	
2006	2,100	1,260	420	420		
2007	1,800	1,080	360	360		
2008	5,200	3,120	1,040	1,040		

○ 그래프 작성

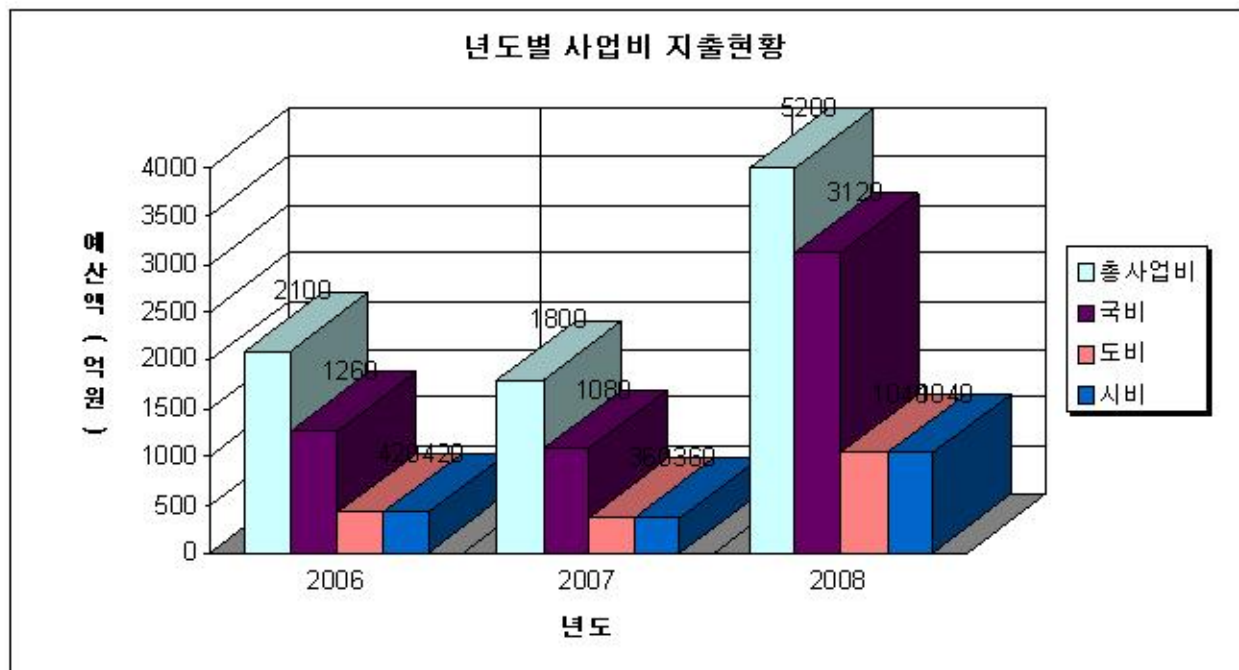

□ 기대효과

- 붕괴위험에 대한 재해요인을 사전제거 해소함으로써 시민들의 재산피해 및 인명피해를 사전예방

○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사후)



노후 수도관교체 사업

담당부서명	전화번호
수도과	450-4533

<목 적>

- 수도관 부식 및 누수로 인한 수돗물 오염방지
- 맑고 깨끗한 수돗물 공급으로 주민생활 편익 증진
- 유수율 상승으로 상수도 공기업 재정 확충

□ 사업개요

- 기 간 : 1980 ~ 계속
- 위 치 : 시내일원(수도관 연장 L=1,567km)
- 사업규모 : 노후관 수도관 L=757km
- 총사업비 : 1,514억원(기투자 : L=355km, 210억원)-시비100%
- '08사업비 : 2,000백만원(시비2,000백만원)
- 사업내용
 - ▷ 고속버스터미널 주변의 17건 공사추진
 - 수도관(φ20~250mm) L=20km 교체

□ 사업진행현황

- '08년도 사업추진 2,000백만원
 - ▷ 교체실적 : 고속버스터미널 주변의 17건 L=20km
- '09.07월말 사업추진 2,011백만원
 - ▷ 교체실적 : 문화동 문화초교외 9건 L=17km, 1,562백만원
 - ▷ 유수율이 낮은 누수다발지역(중동지역) 노후관 전면교체
 - 수도관(φ 20~200mm), L=3,6km교체, 449백만원

□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

(단위 : 백만원)

년도	총 사 업 비					기타
	계	국비	도비	시비	기타	
2005	1,200			1,200		
2006	2,730			2,730		
2007	1,500			1,500		
2008	2,000			2,000		



□ 기대효과

- 누수방지 및 유수율 향상으로 재정손실 최소화
- 수돗물의 안정적 공급으로 시민생활 편익증진
- 블록시스템 구축과 연계 시행에 따른 효율적인 관망 관리·운영

□ 도면 및 사진

○ 위치도면



○ 현장사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



○ 현장 사진(공사후)



농업테마체험공원 조성사업

담당부서명	전화번호
농업기술센터	063-450-3012

<목 적>

- 찾아 와서 보고 느끼고 배우며 체험하는 농업테마공원 조성
- 소비자와 농업인이 함께 이용하고 소통할 수 있는 공간 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2007. 12~2008. 7
- 위 치 : 군산시 개정면 운회리 633-7번지 (농업기술센터 내)
- 사업규모 : 4,950m²(조경 4,145m², 리모델링 805m²)
- 총사업비 : 516백만원(균특 258, 시비 258)
- '08사업비 : 516백만원(균특 258, 시비 258)
- 사업내용
 - 홍보전시관 : 지역농특산물 우수성 홍보 전시 시식 판매
(쌀, 보리, 울외장아찌, 보리국수, 쌀빵, 계절농산물 등)
 - 체험생태학습공간 : 곤충 및 식물 전시
(잠자리 매미 무당벌레 장수하늘소, 식충식물 신경초, 회귀야생화 등)
 - 농업테마공원 : 시민 휴게 공원
 - 수목, 전통작물, 야생화, 연꽃 등을 이용한 조경

□ 사업진행 현황

- 설계용역 발주 : 2007년 8월
- 설계납품 : 2007년 10월
- 시설공사 입찰 및 업체 선정 : 2007년 11월

- 공사발주 : 2007년 12월
- 온실 내부철거 및 보강공사 : 2007년 12월
- 동절기 공사중지명령 : 2008년 1월 ~ 2.29일
- 공사 재개 : 2007. 3
- 2008년 7월 완공

□ 연도별 투자현황

- 연도별 투자 현황

(단위 : 백만원)

년도	총 사 업 비					기타
	계	균특	국비	시비	기타	
2005						
2006						
2007						
2008	516	258		258		

- 공사계약내역

공 사 명	업 체 명	계약금액	비 고
관급자재	조달청	15,034,050	온실 냉방기 4대
건축공사	(주)유경종합건설	437,666,000	
전기공사	(주)청호이엔씨	34,408,000	
폐기물처리	(주)남성환경	17,260,000	
기 타		11,631,950	설계비 등
계		516,000,000	

□ 기대효과

- 찾아 와서 보고 느끼고 배우며 체험하는 농업테마공원 조성
- 소비자와 농업인이 함께 이용하고 소통할 수 있는 공간 제공

□ 도면 및 사진

○ 조감도



○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



○ 현장 사진(공사후)

