

특수공시

□ 특수공시사업(안) : 11건

연번	사 업 명	부 서 명
1	평생학습관 건립	인 재 양 성 과
2	군산새만금 종합비즈니스센터 건립	지 역 경 제 과
3	제3차 도서종합개발	해 양 수 산 과
4	수산물연구가공 거점단지 조성	해 양 수 산 과
5	자원봉사센터 신축	가 족 청 소 년 과
6	새만금 해넘이 명소화 사업	관 광 진 흥 과
7	군산 오토캠핑파크 조성	관 광 진 흥 과
8	군산 실내배트민턴장 건립	체 육 진 흥 과
9	장애인체육관 및 평생교육시설 건립	체 육 진 흥 과
10	운동장~쌍천로 도로개설공사	도 시 계 획 과
11	경포천 재해예방사업	안 전 총 괄 과
12	내항 재해위험지구 정비사업	안 전 총 괄 과
13	대야 삼라교 재가설 공사	건 설 과
14	미성~열대자간 도로개설공사	공 영 사 업 과
15	해망동 보금자리주택 건립	건 축 과
16	교통관리시스템(ATMS) 구축	교 통 행 정 과
17	고군산군도 상수도 시설 공사	수 도 과

1

평생학습관 건립

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2016. 8
- 위 치 : 군산시 미룡동 903-1번지
- 사업규모 : 부지면적 828.2m², 연면적 1,566.51m² (지상 4층)
- 사업내용 : 지상 1층(평생학습카페 등), 2~3층(강의실)
4층(강의실, 다목적실 등)
- 총사업비 : 3,900 백만원(시비)
- 연도별 투자 현황

연도	사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	특교	
계	3,900			3,900		
2014	150			150		
2015	1,500			1,500		
2016	2,250			2,250		

□ 추진현황

- 시설 설치계획 최종 보고 : '13. 6월
- 공유재산 관리계획 의결 : '13. 10월
- 중기지방재정계획 및 자체투융자 심사 : '13. 10월
- 평생학습관 설치에 따른 주민 의견수렴 : '14. 7월
- 기본 및 실시설계용역 : '14. 10월 ~ '15. 6월

□ 기대효과

- 시민들의 평생학습 욕구 충족과 확산을 통한 공동체 의식 고양
- 평생교육활성화를 통한 시민의 정주의식 고취 및 시민의식 함양

□ 위치도



□ 조감도



2

군산새만금 종합비즈니스센터 건립

현대화 사업[작성예시]

□ 사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2014. 6
- 위 치 : 군산시 오식도동 814번지
- 사업규모 : 부지면적 6,600m², 연면적 7,492.93m² (지상 3층)
- 사업내용 : 지상 1층(컨벤션홀 등), 2층(회의실, 기업지원실)
3층(정보자료실, 휴게공간 등)
- 총사업비 : 18,000백만원(국비 4,000, 도비 1,800, 특교 1,000, 시비 11,200)
- 연도별 투자 현황

연도	사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	특교	
계	18,000	4,000	1,800	11,200	1,000	
2010	1,000	1,000				
2011	3,315	1,500	800	1,015		
2012	4,850	1,350		2,500	1,000	
2013	5,735	150	1,000	4,585		
2014	3,100			3,100		

□ 추진현황

- 공유재산 관리계획 의결 : '10. 3월
- 전북도 지방재정 투융자 심사 : '10. 5월
- 기본 및 실시설계용역 : '11. 2월 ~ '11. 9월
- 비즈니스 센터 건립공사 : '12. 1월 ~ '14. 6월
- 비즈니스 센터 개관 : '14. 7월

□ 기대효과

- 동북아 경제허브를 위한 기업활동 지원 및 신규기업 유치 도모
- 전북 MICE 산업의 거점역할 수행으로 지역경제 활성화

□ 위치도



□ 시설사진



3

제3차 도서종합개발

□ 사업개요

- 위 치 : 군산시 옥도면 16개 유인도서
- 규 모 : 단위사업 54건 / 세부사업 81건
(도로시설 53, 방파제 2, 소득기반 및 유형화 26)
- 총사업비 : 42,465백만원 (국비 80%, 도비 10%, 시비 10%)
- 사업기간 : 2008 ~ 2017 (10개년)
- 연도별 투자현황

연도	사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	특교	
계	27,177	19,059	4,060	4,060		
2008	3,748	2,504	622	622		
2009	4,574	3,167	703	704		
2010	4,193	2,935	629	629		
2011	4,574	3,202	686	686		
2012	4,981	3,487	747	747		
2013	3,213	2,249	482	482		
2014	1,144	915	116	115		
2015	750	600	75	75		

□ 추진현황

- 개발대상 도서지정 : '07. 9월
- 제3차 도서종합개발사업 수립 고시 : '08. 1월
- 제3차 도서종합개발사업 시행 (51건) : '08. 1월 ~ '15. 7월

□ 기대효과

- 도서지역 기반시설 확충을 통한 주민 생활환경 개선 및 도서지역 정주여건 향상 기대

□ 위치도



□ 시설사진



4

수산물 연구가공 거점단지 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 군산시 내항2길 296 (수산물종합센터 옆)
- 규 모 : 지상 3~4층, 2개동 (연면적 9,270㎡)
- 내 용 : 연구·가공시설, 물류 위판시설
 - 연구·가공시설 : 홍보·전시판매장, 수산가공공장(6개소) 등
 - 위판·물류시설 : 위판장, 냉동·냉장시설, 가공공장 등
- 총사업비 : 195억원 (국비 50%, 시비 50%)
- 사업기간 : 2013 ~ 2015
- 연도별 투자 현황

연도	사업비 (백만원)						비고
	계	국비	도비	시비	지방채	특교	
계	20,608	9,750	0	5,958	3,900	1,000	
2012	602	300	0	302	0	0	
2013	6,970	4,484	0	2,486	0	0	
2014	9,868	4,966	0	2	3,900	1,000	
2015	3,168	0	0	3,168	0	0	

□ 추진현황

- 군산수산물 연구가공거점단지 조성 기본계획 수립 : '09. 5월
- 지방재정 투융자 심사 : '11. 3월
- 수산물 연구가공거점단지 용역계획 수립 : '12. 2월
- 수산물 연구가공거점단지 조성공사 : '13. 5월 ~ '15. 8월

□ 기대효과

- 군산시 수산물 연구·가공 거점단지의 관리·운영으로 수산물 가공, 유통을 통해 종합 유통체계 구축 및 지역경제 발전에 기여

□ 위치도



□ 시설사진



5

자원봉사센터 신축

□ 사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2016년
- 위 치 : 군산시 삼화안길 9(문화동) 외 2필지
- 사업규모 : 부지 3,446.9㎡, 시설(2층) 1,322㎡
- 사업내용 : 사무실, 교육장, 작업실, 소회의실 등
- 총사업비 : 3,580백만원(시비 3,580)
- 연도별 투자 현황

연도	사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	특교	
계	3,580			3,580		
2014	125			125		
2015	400			400		
2016	3,055			3,055		

□ 추진현황

- 중기지방재정계획 반영 : '13. 9월
- 투·융자 심사 : '13. 10월
- 시정조정위원회 심의 : '13. 12월
- 제175회 임시회 업무보고시 특별보고 : '14. 2월
- 공유재산 관리계획(취득) 의회 승인 : '14. 4월
- 보상 추진 : '15. 3월 ~
- 설계용역의뢰 : '15. 6월

□ 기대효과

- 자원봉사활동 기반조성 및 자원봉사 역량강화를 통한 자원봉사 활성화 도모

□ 위치도



□ 시설사진



6

새만금 해넘이 명소화 사업

□ 사업개요

- 위 치 : 선유도 해수욕장 일원
- 사업기간 : 2012년 ~ 2015년 (4년)
- 사 업 비 : 4,700백만원(국 2,350 시 2,350)
 - 2013년까지 : 3,000백만원(국 2,000 시 1,000)
 - 2014년 : 1,700백만원(국 350 시 1,350)
- 사업내용 : 공중하강체험시설(타워), 연결교량(탐방교), 해넘이전망대 등
- 연도별 투자 현황

연도	사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	특교	
계	4,700	2,350		2,350		
2012	2,200	2,000		200		
2013	800			800		
2014	1,700	350		1,350		

□ 추진현황

- 1차분 공사착공 : '13. 11월
- 1차분 공사준공 : '14. 11월
- 2차분 공사착공 : '14. 10월
- 2차분 공사준공 : '15. 06월
- 공중하강체험시설 개관 : '15. 07월

□ 기대효과

- 고군산군도 연결도로 개통 등 선유도를 찾는 관광객 증가
- 관광객이 사계절 체험할수 있는 레포츠시설 운영

□ 계획도



□ 시설사진



출발지 타워



연결탐방교

□ 사업개요

- 기 간 : 2011년 ~ 2014. 10월
- 위 치 : 군산시 옥산면 대위로 50
- 사업규모 : 부지면적 24,837m²
- 사업내용 : 오토캠핑Site 24면, 캐라반Site 5면, 캐빈사이트 2면
어린이물놀이시설, 주차장, 화장실및취사장, 안내소 등
- 총사업비 : 3,300백만원(국비 1,000 시비 2,300)
- 연도별 투자 현황

연도	사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	기타	
계	3,300	1,000		2,300		
2010	30	-		30		
2011	970	500		470		
2012	500	500		-		
2013	1,200	-		1,200		
2014	600	-		600		

□ 추진현황

- 국민여가캠핑장 신규대상 공모선정(문체부) : '11. 3월
- 지방재정 투융자 심사(자체) : '11. 3월
- 기본 및 실시설계용역 : '11. 5월 ~ '11. 12월
- 공사 시행 : '12. 2월 ~ '14. 10월
- 캠핑장 임시개장 : '14. 10월 ~ '14. 12월
- 민간위탁자 선정 및 정식운영 : '15. 1월

□ 기대효과

- 가족단위의 체류형 관광상품 개발 및 중저가형 관광숙박시설 확충
으로 시민들에게 휴식공간을 조성하고 외부 관광객의 유입을 통한
지역경제 활성화 및 군산 관광 매력도 향상에 기여

□ 위치도



□ 전경사진



□ 사업개요

- 기 간 : 2010년 ~ 2015. 07.
- 위 치 : 군산시 수송동 701-1 일원(새들공원내)
- 사업규모 : 부지면적 4,527㎡, 연면적 6,553㎡(지하1층, 지상2층)
- 사업내용 : 배드민턴 15면 및 부대편의시설
- 총사업비 : 12,000백만원(국비 3,600, 시비 8,400)
- 연도별 투자 현황

연도	사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	특교	
계	12,000	3,600	-	8,400	-	
2013	3,500	1,200	-	2,300	-	
2014	4,900	2,400	-	2,500	-	
2015	3,600	-	-	3,600	-	

□ 추진현황

- 전라북도 투융자 심사 : '10. 05월
- 실내배드민턴장 건립 설계용역 : '10. 08월 ~ '11. 06월
- 전라북도 원가 심사 완료 : '11. 09월
- 건축공사 1차분 착공 및 준공 : '11. 12월 ~ '13. 03월
- 건축공사 2차분 착공 및 준공 : '13. 04월 ~ 11월
- 건축공사 3차분 착공 및 준공 : '14. 04월 ~ 12월
- 건축공사 4차분 착공 및 준공 : '15. 03월 ~ 07월

□ 기대효과

- 도심속의 생활체육공간조성으로 시민들의 여가활용 및 건강증진 도모
- 동호인 및 시민들의 오랜 숙원사업 해소로 생활체육 활성화 기대

□ 위치도



□ 시설사진



9 장애인 체육관 및 평생교육시설 건립

□ 사업개요

- 기 간 : 2010. 01. ~ 2016. 12.
- 위 치 : 군산시 성산면 성덕리 461-8 일원(금강공원내)
- 사업규모 : 부지면적 9,660m², 연면적 4,679m²(지상 3층)
- 사업내용 : 다목적체육관, 평생교육실, 부대편의시설등
- 총사업비 : 17,200백만원(국비 4,200, 도비 1,400, 시비 11,600)
- 연도별 투자 현황

연도	사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	특교	
계	17,200	4,200	1,400	11,600	-	
2013	700	300	100	300	-	
2014	2,100	1,600	-	500	-	
2015	3,121	2,300	500	321	-	
2016	11,279	-	800	10,479	-	

□ 추진현황

- 전라북도 투융자 심사 : '10. 05월
- 실내배드민턴장 건립 설계용역 : '10. 08월 ~ '11. 06월
- 전라북도 원가 심사 완료 : '11. 09월
- 건축공사 1차분 착공 및 준공 : '11. 12월 ~ '13. 03월
- 건축공사 2차분 착공 및 준공 : '13. 04월 ~ 11월
- 건축공사 3차분 착공 및 준공 : '14. 04월 ~ 12월
- 건축공사 4차분 착공 및 준공 : '15. 03월 ~ 07월

□ 기대효과

- 장애인의 체육 및 평생교육활동을 통한 사회참여 증진과 사회통합 분위기 조성
- 전문화된 체육 및 평생교육시설을 통해 신체적 기능회복과 재활 도모

□ 위치도



□ 조감도



10 운동장~쌍천로 도로개설공사

□ 사업개요

- 기 간 : 2010. 2 ~ 2016. 12
- 위 치 : 운동장~쌍천로
- 사업규모 : L=850m, B=30m
- 사업내용 : 도시계획 도로개설
- 총사업비 : 9,500백만원(시비 9,500)
- 연도별 투자 현황

연도	사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	특교	
계	4,200			4,200		
2013	2,900			2,900		
2014	1,000			1,000		
2015	300			300		


□ 추진현황

- 투융자 심사 : '10. 5. 25
- 실시설계용역 : '10. 3. 2 ~ '10. 5. 27
- 실시계획인가 : '10. 8. 20
- 편입토지 및 지장물 보상 : '11. 1월 ~ '15. 7월

□ 기대효과

- 시청~운동장간 도로와 연계된 기반시설 확충
- 출·퇴근 등 교통편익 제공 및 지역경제 활성화 기대

□ 위치도

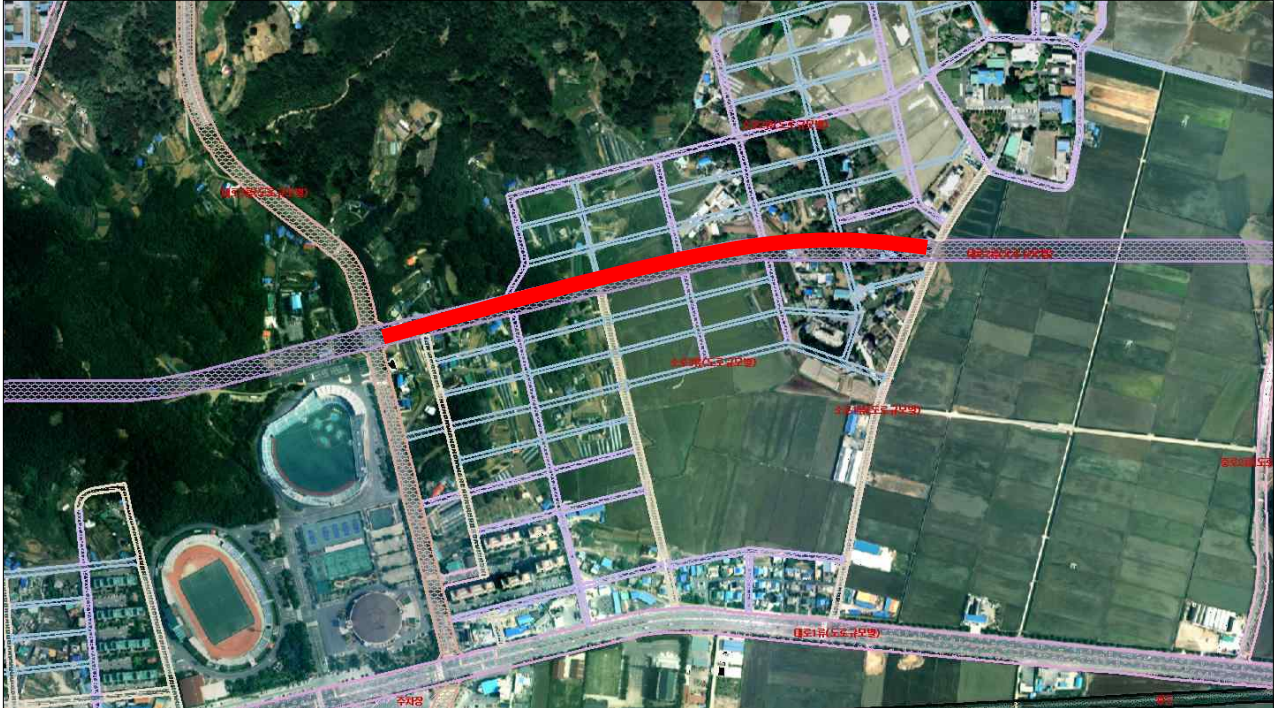

11 경포천 재해예방사업

□ 사업개요

- 기 간 : 2009년 ~ 2016년 (8년)
- 위 치 : 군산시 경암동 송경교 ~ 수송동 원협공판장
- 사업규모 : L= 2.25km, B= 50~70m
- 사업내용 : 호안축제, 수문, 교량, 산책로, 쉼터, 부대공 등
- 총사업비 : 33,560백만원 (국비 20,136 도비 6,712 시비 6,712)
- 연도별 투자 현황

연도	사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	기타	
계	21,484	16,092	5,363	5,214		
'13년까지	14,130	11,592	3,863	3,860		
2014년	7,354	4,500	1,500	1,354		


□ 추진현황

- 경포천 기본계획 수립·고시 : '07. 12. 21
- 공사 착공 (전체분 및 1차분) : '12. 10. 29
- 공사 준공(1차분 및 수문) : '13. 6. 25
- 2차분착공 및 준공 : '13.2.1 ~ '14.5.6
- 3차분 착공 : '14. 3. 28
- 총사업비 변경승인(297→335.6억원) : '14. 6. 26

□ 기대효과

- 경포천 지방하천 정비로 도심지 침수피해 사전예방
- 도심하천 정비로 시민의 휴식공간 제공 및 삶의 질 향상

□ 위치도

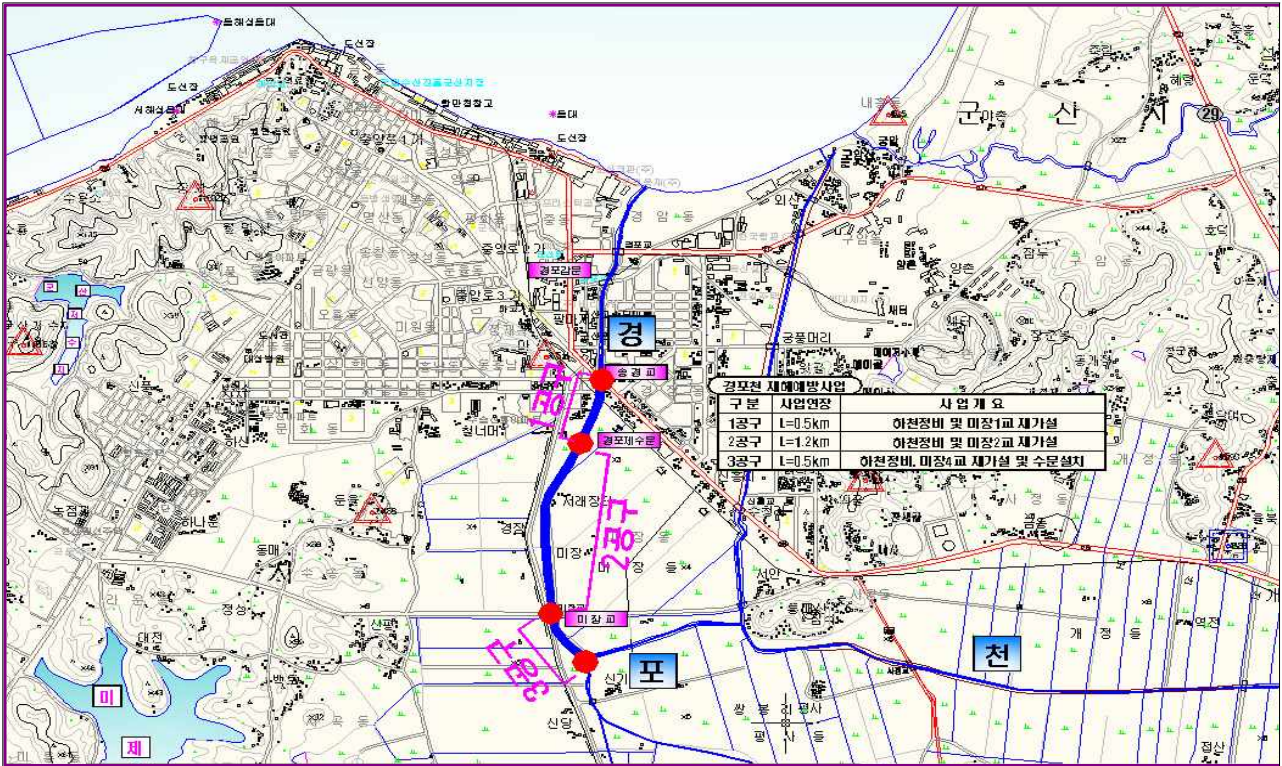

□ 현장사진



12 내항 재해위험개선지구 정비사업

□ 사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2016년 (3년)
- 위 치 : 장미동 1-72번지 일원 (내항)
- 사업규모 : 배수펌프장 550m³/min 및 유수지 14천톤
- 총사업비 : 22,062백만원 (국비 11,031 도비 4,412 시비6,619)
- 연도별 투자 현황

연도	사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	기타	
계	4,920	2,588	1,035	1,297		
'13년까지	997	-	-	997		
2014년	3,923	2,588	1,035	300		

□ 추진현황

- 자연재해위험개선지구 지정 : '12. 12월
- 실시설계 및 설계 사전심의(국민안전처) : '14. 11월
- 내항 자연재해위험개선지구 정비사업 발주 : '14. 12월

□ 기대효과

- 도심지 저지대의 상습 침수지역에 대하여 배수펌프장 및 유수지를 설치하여 상습침수 피해를 방지하여 주민의 생명과 재산의 보호

□ 위치도



□ 조감도



□ 사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2017년
- 위 치 : 군산시 대야면 접산리 라궁마을
- 사업규모 : 교량재가설 및 접속도로 설치 1식
- 사업내용 : 삼라교 재가설 L=103m, B=10.0m
접속도로 L=1.28km, B=8.0m
- 총사업비 : 3,500백만원
- 연도별 투자 현황

연도	사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	특교	
계	2,350	0	0	650	1,700	
2010이전	150			150		
2013	1,700				1,700	
2014	0					
2015	500			500		


□ 추진현황 - 총공정 54%

- 투융자 심사 '05.09월
- 기본 및 실시설계용역 '14.01월 ~ '14.04월
- 1차분 공사시행(교량재가설 완료) '14.06월 ~ '15.11월
- 2차분 공사시행(접속도로 토공 일부) '15.01월

□ 기대효과

- 농촌간 도로망 확충으로 주민 교통편익 도모
- D급 교량 재가설을 통한 재해위험 요인 제거 및 안전사고 예방

□ 위치도

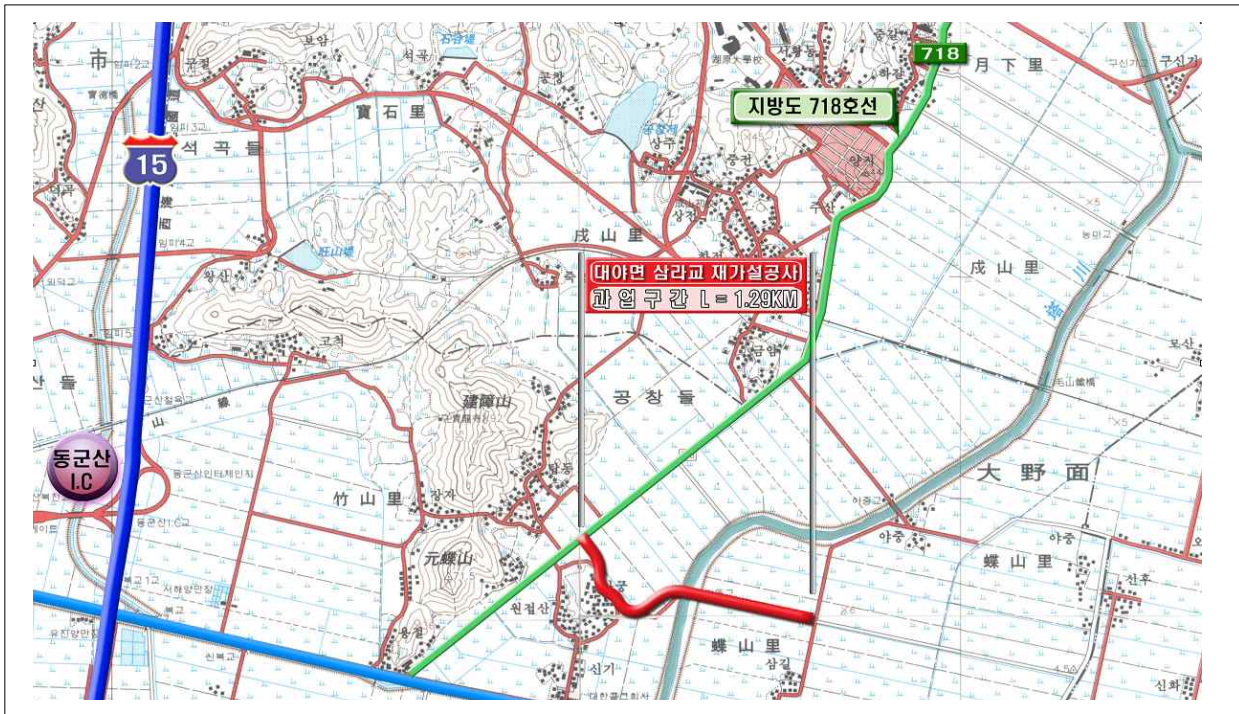

□ 시설사진



14 미성 ~열대자간 도로개설공사

□ 사업개요

- 위 치 : 미성동 해성교회 ~ 외항로
- 규 모 : L=3.27km, B=30m
- 총사업비 : 33,800백만원(국비 50% 시비 50%)
 - 기투자금액 : 12,695백만원 (국비 9,221 시비 3,474)
 - '15년 사업비: 5,007백만원 (국비 5,000 시비 7)
- 사업기간 : '11. 4 ~ '18. 5월
- 연도별 투자 현황

연도	사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	특교	
계	12,695.7	9,221.6		3,474.1		
2011		500		500		
2012		700		2.5		
2013		5,500		2,350		
2014		2,521.6		621.6		


□ 추진현황

- 실시설계 및 도시계획결정 : '11. 04월 ~ '12. 12월
- 보상계획 공고 : '12. 11월
- 도로 편입토지보상(전체 토지 195, 지장물 40) : '13. 01. ~ 현재
 - 토지수용재결 신청 : 토지 11건, 지장물 2건
- 중앙 지방재정 투융자 심사 : '15. 02월
- 건설사업관리용역 착수 : '15. 04월
- 공사계약 및 착수 : '15. 05월

□ 기대효과

- 도심과 산업단지 간 교통망 확충을 통한 지역발전 도모
- 공여구역 주변지역 균형개발 및 정주여건개선, 주민생활편익 제공

□ 위치도

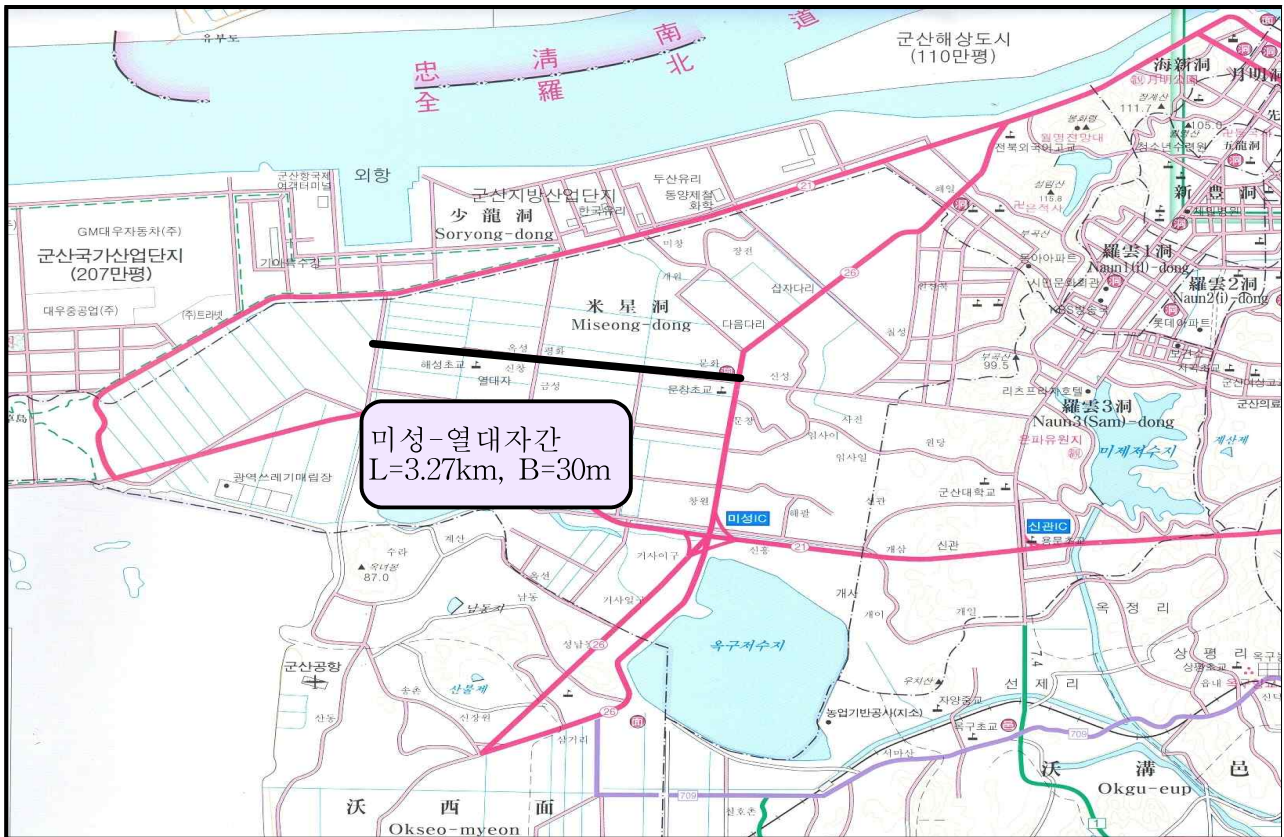

□ 시설사진



□ 사업개요

- 기 간 : 2012. 3 ~ 2015. 8
- 위 치 : 군산시 해망동 1004번지 일원
- 사업규모 : 부지면적 22,620㎡, 연면적 33,918㎡ (지상 15층)
- 사업내용 : 임대주택 483세대(영구임대 148, 국민임대 335)
- 총사업비 : 48,200백만원(국비 19,100, 지방채 13,400, 입주자 부담금 5,900, 시비 9,800)
- 연도별 투자 현황

연도	사업비 (백만원)					비고
	계	국비	지방채	입주자 부담금	시비	
계	48,200	19,100	13,400	5,900	9,800	
2012	6,990	4,790	0	0	2,200	
2013	15,610	6,230	9,380	0	0	
2014	7,940	5,260	2,680	0	0	
2015	17,660	2,820	1,340	5,900	7,600	


□ 추진현황

- 타당성조사용역실시 : '11.11.
- 중앙투융자심사 심의 : '11.12.
- 주택건설사업계획승인 : '12.11.
- 공사착공 : '13. 7.
- 지하층 골조공사 : '14. 3.
- 아파트 골조공사 : '14. 8.
- 내부마감 및 부대토목·조경공사등 : '15. 8.

□ 기대효과

- 공익사업으로 인한 이주민의 재정착과 무주택서민의 주거공간 마련

□ 위치도

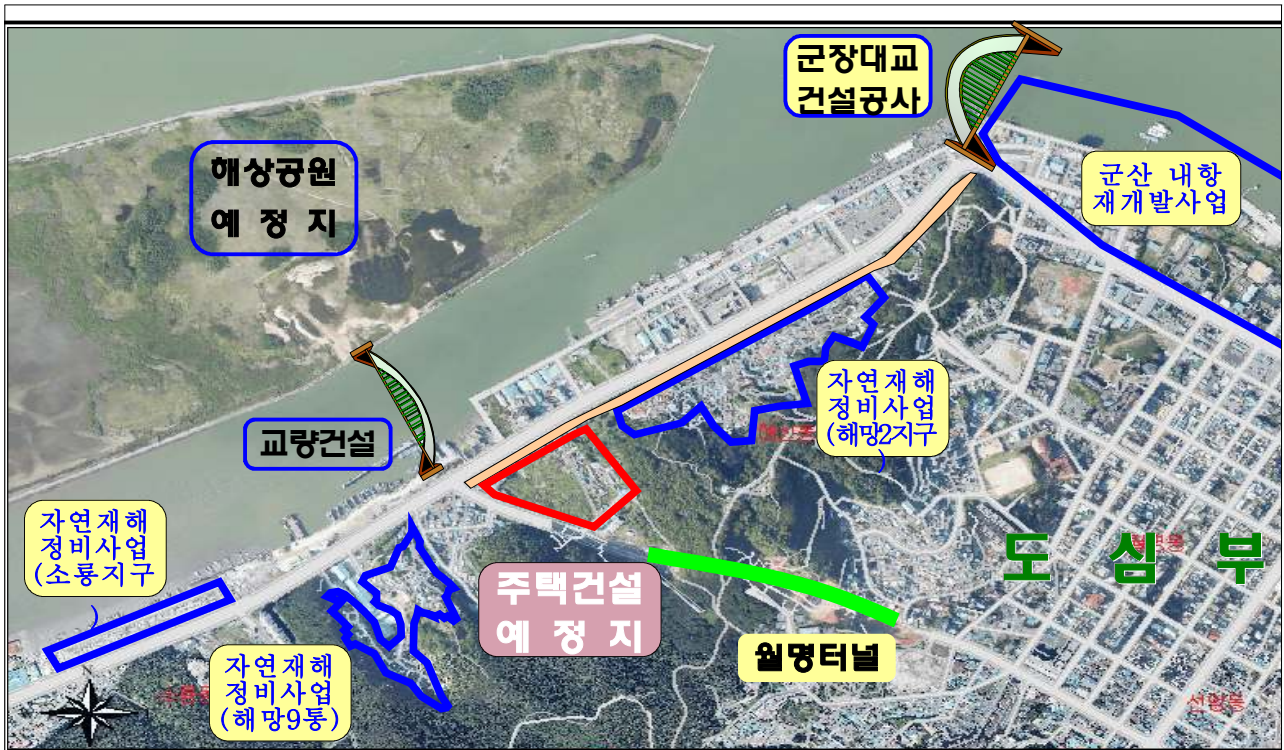

□ 조감도



16 교통관리시스템(ATMS) 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2013. 7 ~ 2015. 3
- 사업구간 : 서해안고속도로 진출·입로 및 시내 주요도로
- 사업내용
 - DSRC RSE (노변무선기지국) 및 자가망 구축 등 통신 인프라 구축
 - VDS, VMS, CCTV, 네트워크 카메라 등 현장 시설물 구축
 - 센터 H/W 및 S/W 개선 등
- 총사업비 : 3,600백만원(국비 1,800, 시비 1,800)
- 연도별 투자 현황

연도	사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	특교	
계	3,600	1,800		1,800		
2013	1,800	1,800				
2014	852			852		
2015	948			948		

□ 추진현황

- 첨단교통관리시스템(ATMS) 구축사업 설계용역 : '13. 07 ~ '14. 1월
- 첨단교통관리시스템(ATMS) 구축사업 : '13. 12 ~ '15. 3월
- 첨단교통관리시스템(ATMS) 구축사업 감리용역 : '14. 01 ~ '15. 3월

□ 기대효과

- 교통혼잡 구간인 시내부의 첨단교통시설 구축으로 시민 교통편의 증진
- 교통정보수집 결측구간에 ITS 구축으로 신뢰성 있는 교통수집제공 서비스 향상

□ 참고사진



17 고군산군도 상수도 시설 공사

□ 사업개요

- 위 치 : 군산시 오식도동, 신시, 무녀, 선유, 장자도 구간
- 규 모 : 상수관로(Φ200~700) L=19.7km(오식도~장자도)
배수지 1개소(V=4,000m³), 가압장 1개소
- 사 업 비 : 171억원(광특 120, 시비 51)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비	광 특	시 비	비 고
총사업비	17,191	12,034	5,157	
2012년까지	6,099	4,022	2,077	
2013년	4,328	3,540	788	
2014년	4,586	2,700	1,886	
2015년	2,178	1,772	406	

- 사업기간 : 2011. 6. ~ 2016. 12.

⇒ 사업기간 연장사유 : 고군산군도 연결도로사업 지연에 따른
공사중지로 인한 공기연장 (도로 준공 연기 '12→'14→'16년)

□ 추진현황

- '09. 12. 22 : 고군산군도 상수도시설 기본 및 실시설계 용역 시행
- '12. 02. 01 : 시설결정고시(수도시설 : 배수지 12,100m³)
- '12. 06. 29 : 1차분 공사 완료
~ '13. 06. 02.
- '13. 04. 30 : 2차분 공사 착수
- '14. 05. 14 : 3차분 공사 착수
- '14. 08. 19 : 2, 3차분 중지(진입로 선형변경, 도로공사 지연등)
- '15. 07. 03 : 3차분 공사중지 해제

□ 기대효과

- 고군산 군도 생활용수 공급으로 주민생활 불편 해소 및 관광 활성화 도모

□ 위치도



□ 공사사진

