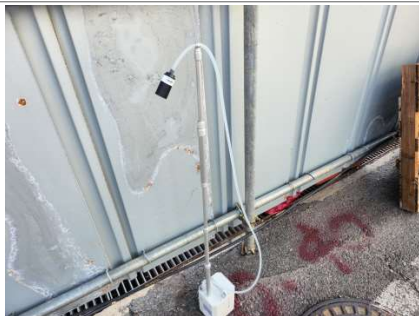


1. 측정결과 - 2022. 10. 13.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 6대	#1	부지경계선1	9.88	245	0.0020	이하
	#2	부지경계선2	9.90	245	0.0018	이하
	#3	부지경계선3	9.89	245	0.0022	이하
	#4	부지경계선4	9.91	245	0.0022	이하
	#5	폐기물보관지점1	9.93	45	0.0037	이하
	#6	폐기물보관지점2	9.89	45	0.0037	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 6대			
측정지점	비산측정 시작 사진		결과(f/cc)
부지경계선1			0.0020
	측정 시작 시간 08:39 측정 종료 시간 12:44		
부지경계선2			0.0018
	측정 시작 시간 08:40 측정 종료 시간 12:45		
부지경계선3			0.0022
	측정 시작 시간 08:43 측정 종료 시간 12:48		
부지경계선4			0.0022
	측정 시작 시간 08:45 측정 종료 시간 12:50		
폐기물 보관지점1			0.0037
	측정 시작 시간 08:31 측정 종료 시간 09:16		

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 보관지점2			0.0037
	측정 시작 시간 08:32	측정 종료 시간 09:17	
