

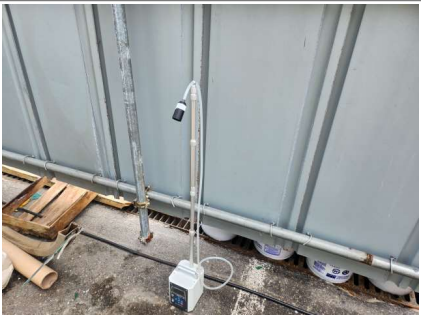
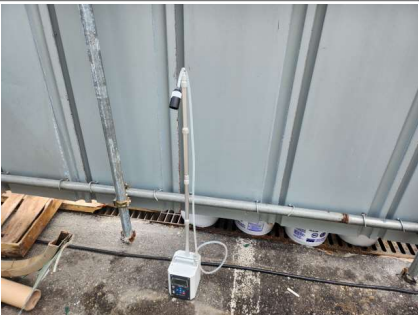
1. 측정결과 - 2022. 10. 15.

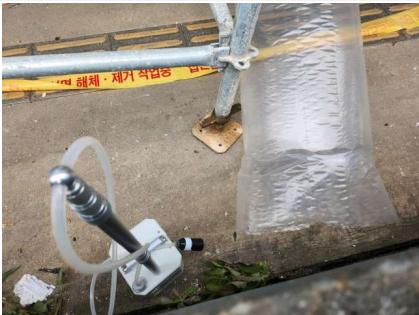
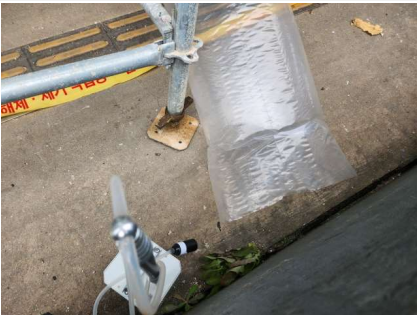
측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 16대	#1	부지경계선1	9.90	245	0.0022	이하
	#2	부지경계선2	9.92	245	0.0022	이하
	#3	부지경계선3	9.85	245	0.0020	이하
	#4	부지경계선4	9.89	245	0.0020	이하
	#5	작업장주변	9.93	125	0.0047	이하
	#6	위생설비입구	9.92	45	0.0026	이하
	#7	음압기공기배출구1	9.88	45	0.0033	이하
	#8	음압기공기배출구2	9.92	45	0.0029	이하
	#9	음압기공기배출구3	9.94	45	0.0033	이하
	#10	음압기공기배출구4	9.88	45	0.0033	이하
	#11	음압기공기배출구5	9.89	45	0.0029	이하
	#12	음압기공기배출구6	9.91	45	0.0026	이하
	#13	음압기공기배출구7	9.89	45	0.0029	이하
	#14	폐기물반출구	9.92	45	0.0037	이하
	#15	폐기물보관지점1	9.90	45	0.0026	이하
	#16	폐기물보관지점2	9.95	45	0.0033	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 16대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0022
	측정 시작 시간 08:34	측정 종료 시간 12:39	
부지경계선2			0.0022
	측정 시작 시간 08:34	측정 종료 시간 12:39	
부지경계선3			0.0020
	측정 시작 시간 08:40	측정 종료 시간 12:45	
부지경계선4			0.0020
	측정 시작 시간 08:41	측정 종료 시간 12:46	
작업장주변			0.0047
	측정 시작 시간 08:36	측정 종료 시간 10:41	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
위생설비 입구			0.0026
	측정 시작 시간 08:37	측정 종료 시간 09:22	
음압기공기 배출구1			0.0033
	측정 시작 시간 08:51	측정 종료 시간 09:36	
음압기공기 배출구2			0.0029
	측정 시작 시간 08:51	측정 종료 시간 09:36	
음압기공기 배출구3			0.0033
	측정 시작 시간 08:52	측정 종료 시간 09:37	
음압기공기 배출구4			0.0033
	측정 시작 시간 08:53	측정 종료 시간 09:38	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
음압기공기 배출구5			0.0029
	측정 시작 시간 08:54	측정 종료 시간 09:39	
음압기공기 배출구6			0.0026
	측정 시작 시간 08:56	측정 종료 시간 09:41	
음압기공기 배출구7			0.0029
	측정 시작 시간 08:56	측정 종료 시간 09:41	
폐기물 반출구			0.0037
	측정 시작 시간 08:38	측정 종료 시간 09:23	
폐기물 보관지점1			0.0026
	측정 시작 시간 09:01	측정 종료 시간 09:46	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 보관지점2			0.0033
	측정 시작 시간 09:02	측정 종료 시간 09:47	
